



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

SEPTIEMBRE 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/18/10-0477
ASUNTO: REPORTE MES DE
SEPTIEMBRE

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Septiembre 2019**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 18 de Octubre de 2019.

A T E N T A M E N T E



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.

c.c.p.- Archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/18/10-0478
ASUNTO: REPORTE MES DE
SEPTIEMBRE

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Septiembre 2019**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 18 de Octubre de 2019.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



c.c.p.- Archivo



ACTA NUMERO **45** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICA
ÚNICA

REGIDOR
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

REGIDORA
SEGUNDA

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. -----

REGIDOR
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019. -----

REGIDORA
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

SECRETARIO
AYUNTAMIENTO

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. -----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de septiembre de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019.-----

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de septiembre de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos durante el mes y de CAPUFE 2019, FISM DF 2019, Recursos Fiscales. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de septiembre del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de septiembre del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA.-----

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICA
ÚNICA

REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA

REGIDOR
TERCERO

REGIDORA
CUARTA

SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SÍNDICA

ROSÁ MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

C. _____

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA

C. _____

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO



C. _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

C. _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

REGIDURIA TERCERA



C. _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA CUARTA

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. _____

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52041

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

SIN MOVIMIENTOS EN EL
PERIODO.

SELLO DIGITAL:

QAZ9BNf5UpShhz4FIH0o8rEhEH3yzprPlwUIG6VBHq/YFTWSEqjftxXGij0AXD7dVdarQO60x1MDIt5wyO7TA43vNTd3kxw5NA8XOd1/hwqbd/ESs0dZh67y7I+HNH2ektp+FpbnaVTY8ruOt0SihoRU+BYR0otjNJXGmdx91O4=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52042

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690003	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	No	No	No	No
2019300690002	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO	No	No	No	No
2019300690001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

LSOTob8qGP+KZm9HzqOJDRe71b+XRgINyBZNY4aV1sfXYrN9Dy0LMtZPJaj+L1W3VFHDcKG15QqC4Ptfxaq67tdXEuxciJswPiEnu8yaVlkwe1EL5ghwwWH6YfRt9CnsgBVSJ8OwGo9HU/6nGr8eMpVjPK2BIDEUOFjUilUEs=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52503

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690450	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200.	No	No	No	No
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2019300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2019300690453	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138.	No	No	No	No
2019300690454	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO RURAL EL CEPILLO ENTRONQUE CAMINO VIEJO ENSENADA EL CEPILLO DEL KM 0+00 AL 0+127	No	No	No	No
2019300690455	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.	Sí	Sí	Sí	No
2019300690456	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LA RIVERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y CALLE MORELOS	Sí	No	Sí	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	No	No	No	No
2019300690458	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

oN5V6CYUCIOcymTRi1zj1KJecs0ActjRvxLXwaV1cK6r92x3xBJF3pw7R4OPd7GxPwecpEgvNozGTDkmoTVLx/VHsdNSBym2BZS9ItDsYHExnLWeenATah9kacE9YoGNOuBMzaCgJey+pl3971wkBduK19I8Xk3jylqJOPXoG0=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500	No	No	No	No
2019300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000	No	No	No	No
2019300690103	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No
2019300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	No	No	No	No
2019300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL	No	No	No	No
2019300690106	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y	No	No	No	No
2019300690107	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS	No	No	No	No
2019300690108	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2019300690109	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2019300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0151 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

ewmBgCmTkK8XwJ9bUmqrCyI529sf+xUYfS82jA0Tad7mz9V+HuAC6iZ1YgJhmDF7qBpuby815jOkOgrQmtYcVM7atWvEmRccKMxsavxXDMVyxu9JPnKjpC6x1xoGkhXv9M4Oya9evkCUmb7LeFL+ml05qNuj7PLI69NiWKI7R4U=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2019300690123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No
2019300690124	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2019300690125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No
2019300690126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2019300690127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO	No	No	No	No
2019300690128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2019300690129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2019300690130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL PORTUGUÉS	No	No	No	No
2019300690131	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No
2019300690132	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2019300690133	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD	No	No	No	No
2019300690134	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690135	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO	No	No	No	No
2019300690136	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO	No	No	No	No
2019300690137	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FIDEL HERRERA DE LA AGEB 019A	No	No	No	No
2019300690138	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCO	No	No	No	No
2019300690139	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ENSENADA DEL CEPILLO	No	No	No	No
2019300690140	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CEPILLO	No	No	No	No
2019300690141	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	No	No	No	No
2019300690142	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARIO HERNÁNDEZ POSADAS	No	No	No	No
2019300690143	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2019300690144	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2019300690145	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE	No	No	No	No
2019300690146	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2019300690147	REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690148	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE: 30EJN0082Z	No	No	No	No
2019300690149	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2019300690150	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MÉXICO, LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2019300690151	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2019300690152	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE	No	No	No	No
2019300690153	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL	No	No	No	No
2019300690154	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2019300690155	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN	No	No	No	No
2019300690156	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690157	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690158	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	Sí	No	Sí	No
2019300690159	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

ewmBgcMtkK8XwJ9bUmqrqcyi529sf+xUYfS82jA0Tad7mz9V+HuAC6iZ1YgJhmDF7qBpuby815jOkOgrQmtYcVM7atWvEmRccKMxsavxXDMVyXu9JPnKjpC6x1xoGkhXv9M4Oya9evkCUmb7LeFL+mi05qNuj7PLI69NiWKI7R4U=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690160	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN	Sí	No	Sí	No
2019300690161	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2019300690162	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO LAS BOMBAS RICARDO FLORES MAGÓN	No	No	No	No
2019300690163	REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE DE ABASOLO Y CALLEJÓN BUSTAMANTE EN COLONIA	No	No	No	No
2019300690164	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U, COL. ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2019300690170	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, ANCLÓN Y ARENAL	No	No	No	No
2019300690171	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA IGLESIA AL RÍO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	Sí	No	Sí	No
2019300690165	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2019300690166	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: PANCHO DURAN-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2019300690168	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EMILIO MARTÍNEZ ESQUINA CHENEL-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690169	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUSTINIANO VÁZQUEZ-ANTONIO BANDALA, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2019300690167	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/52528



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

ewmBgcMtkK8XwJ9bUmqrCyI529sf+xUYfS82jA0Tad7mz9V+HuAC6iZ1YgJhmDF7qBpuby815jOkOgrQmtYcVM7atWvEmRccKMxsavvXDMVyxu9JPnKjpC6x1xoGkhXv9M4Oya9evkCUmb7LeFL+ml05qNuj7PLi69NIWKI7R4U=

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690158	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	02/10/2019

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RICARDO FLORES MAGÓN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690160	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	02/10/2019



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690171	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA IGLESIA AL RÍO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	02/10/2019



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690455	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	02/10/2019



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**
LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690455	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN :			Fuente de Financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	02/10/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

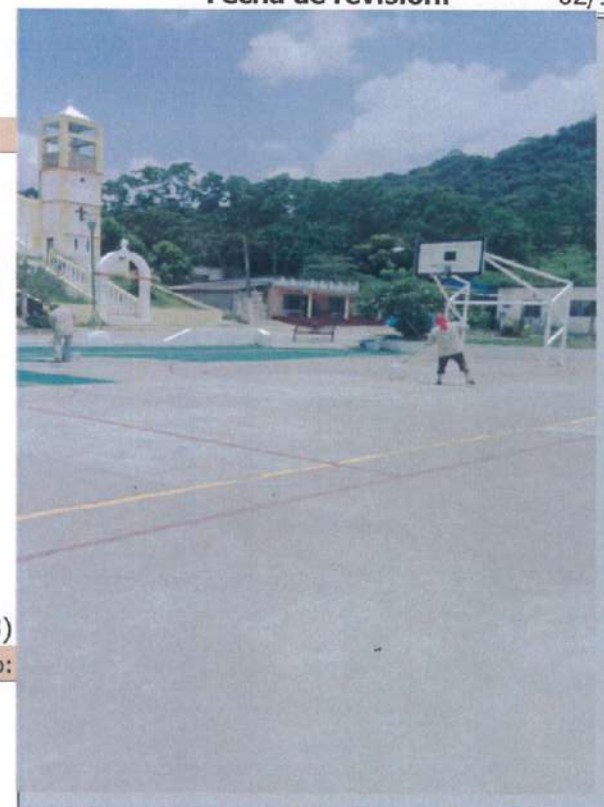


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690456	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LA RIVERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y CALLE MORELOS			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	02/10/2019



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:




ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	02/10/2019
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA:	2019300690158
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA

ANTECEDENTES:

[illegible]

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

ESTADO FINANCIERO DE OBRA									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$476,107.17	2	\$476,107.17	1046	\$478,168.24	\$0.00	\$2,061.07	\$0.00	\$476,107.17

REPORT

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$478,168.24	11/07/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$478,168.24	11/07/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:


 OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

MONTO AUTORIZADO:		\$478,168.24			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$478,168.24			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X	
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:		MGZ-FISM 2019/0158/OP-047		FECHA:		21/06/2019	
CONTRATISTA:		ROMA ASC S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$478,168.24					C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		22/06/2019		22/06/2019	
		TERMINO		31/08/2019		11/07/2019	
		DÍAS		71		20	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$41,221.40	\$47,816.82	
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY,		FIANZAS MONTERREY,
No. DE FIANZA:		19786810	19786020	
FECHA:		21/06/2019	11/07/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO			
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$478,168.24	C/IVA	

ING. RODOLFO SUTÍERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	02/10/2019
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RICARDO FLORES MAGÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690160	
				CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--------------------------------	--	--	--	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

ESTADO FINANCIERO DE OBRA									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$95,555.90	1	\$95,555.90	1061	\$95,969.56	\$0.00	\$413.66	\$0.00	\$95,555.90
					</				

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$95,969.56	23/07/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$95,969.56	23/07/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL $f'_{c}=150 \text{ KG/CM}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL $f'_{c}=150$ KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

MONTO AUTORIZADO:		\$95,969.56		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$95,969.56		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		MGZ-FISM 2019/0160/OP-049		FECHA:		08/07/2019	
CONTRATISTA:		ROMA ASC S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$95,969.56 C/IVA					
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		09/07/2019		09/07/2019	
		TÉRMINO		31/08/2019		23/07/2019	
		DÍAS		54		15	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:		\$8,273.24	\$9,596.96		
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY,	E FIANZAS MONTERREY,		
No. DE FIANZA:		19786961	19786070		
FECHA:		08/07/2019	23/07/2019		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$95,969.56		C/IVA

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER GROSICO LÓPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
02/10/2019
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA IGLESIA AL RIO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690171		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.421559000	LONGITUD	-97.181051000	

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*								
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$2,392,978.51	2	\$2,392,978.51	71	\$2,403,337.72	\$0.00	\$10,359.21	\$2,392,978.51
TOTALES	\$2,392,978.51		\$2,392,978.51		\$2,403,337.72	\$0.00	\$10,359.21	\$2,392,978.51

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$2,403,337.72	02/09/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,403,337.72	02/09/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	85	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	85	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	85	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR, CARGAS DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR, CARGAS DE

MONTO AUTORIZADO:	\$2,403,337.72	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,403,337.72	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO APLICA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM 2019/0171/OP-058	FECHA:	02/08/2019
CONTRATISTA:	EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$2,403,337.72	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/08/2019	05/08/2019
	TÉRMINO	16/09/2019	03/09/2019
	DÍAS	47	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$207,184.29	\$240,333.77	
AFIANZADORA:	E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,		
No. DE FIANZA:	19787005	19788063	
FECHA:	02/08/2019	03/09/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,403,337.72	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER PROSTICO LÓPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /52042

**C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/10/2019 03:12:23 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

LSOTob8qGP+KZm9HzqOJDRye71b+XRglINYBZNY4aV1sfXYrN9Dy0LMtZPJJaJ+L1W3VFHDcKG15QqC4
PtfXaq67tdXEuxciJswPiEnu8yaVlkwe1EL5ghwwwWH6YfRt9CnsgBVSJ8OwGo9HU/6nGr8eMpVjPK2BIDEU
OFFjUilUES=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /52041

**C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/10/2019 03:09:38 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

QAZ9BNf5UpShhz4FIH0o8rEhEH3yzprPlwUIG6VBHq/YFTWSEqjftxXGij0AXD7dVdarQO60x1MDIt5wyO7T
A43vNTd3kxw5NA8XOd1/hwqbd/ESs0dZh67y7I+HNH2ektp+FpbnaVTY8ruOt0SihoRU+BYR0otjNJXGmdx
91O4=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /52528

**C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2019 04:10:01 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ewmBgcMtkK8XwJ9bUmqrCyI529sf+xUYfS82jA0Tad7mz9V+HuAC6iZ1YgJhmDF7qBpuby815jOkOgrQmtYcVM7atWvEmRccKMxsavxXDMVyxu9JPnKjpC6x1xoGkhXv9M4Oya9evkCUmb7LeFL+mI05qNuj7PLI69NiWKI7R4U=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /52503

**C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2019 03:25:20 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

oN5V6CYUCIOCymTRi1zj1KjEcs0ActjRvxLXwaV1cK6r92x3xBJF3pw7R4OPd7GxPwecpEgvNozgTDkmoTV
Lx/VHsdNSBym2BZS9ltdsYHexnLWweenATah9kacE9YoGNOuBMzaCgJey+pl3971wkBduK19l8Xk3jylqJOF
PXOg0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA

PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: SEPTIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 25/10/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 0477 REMITE ESTADOS DE OBRA SEPTIEMBRE 2019	25/10/2019	11:08:39
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 45 APROBACIÓN ESTADOS DE OBRA SEPTIEMBRE 2019	25/10/2019	11:14:08
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTA DE OBRAS MES SEPTIEMBRE 2019	25/10/2019	11:15:13
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FORMA DE REPORTE FOTOGRÁFICO MES SEPTIEMBRE 2019	25/10/2019	11:21:39
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		FORMATO DE OBRAS POR CONTRATO SEPTIEMBRE 2019	25/10/2019	11:26:42
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) TERCER TRIMESTRE	✓		FORMA REPORTE TRIMESTRE 3 TODOS LOS FONDOS	25/10/2019	11:42:16

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
